



*Syndicat Intercommunal pour la Collecte et le Traitement
des Eaux Usées des Bassins de la Thève et de l'Ysieux*



COMMUNE DE MORTEFONTAINE



ENTRETIEN ET EXPLOITATION DES RESEAUX D'EAUX USEES.

BILAN D'ACTIVITES DE L'ANNEE 2019

COMMUNE DE MORTEFONTAINE

S O M M A I R E

I - SITUATION DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

II - TRAVAUX D'ENTRETIEN REALISES EN 2019

- a) Programme de curage et d'inspection télévisée des collecteurs eaux usées y compris branchements particuliers
- b) Interventions d'urgence
- c) Entretien des postes de refoulement
- d) Travaux sur les réseaux
- e) Divers

III - BILAN FINANCIER 2019

ANNEXES

I – SITUATION DES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT EAUX USEES

	Collecteur		
	L (ml)	Nature	D (mm)
allée de la fontaine du curé	132	PVC	200
allée de la fontaine du curé - antenne du 19/21	35	PVC	200
allée de la Tourelle (jusqu'au PRC8) - du 1 au 10	112	PVC	200
allée de la Tourelle (jusqu'au PRC8) - du 7 au 18	100	PVC	200
allée de la Tourelle -Vignes (refoulement de PRC8)	112	PVC	80
allée de la Tourelle -Vignes (aval du ref. du PRC8)	48		
av du Nautonnier - du 1 au 14	160	PVC	200
av du Nautonnier - du 13 au 20	99	PVC	200
impasse de Vallière	135	PVC	150
impasse de Vallière - purge refoul. en tête de réseau	12	PVC	150
impasse du verger	105	AC	150
impasse Watteau	70	PVC	150
rue Corot - retrait de 16,15 ml en 2014	245	AC	150
rue Corot (amont)	16	F	200
rue de l'église	155	AC	150/200
rue des vignes	438		
rue du Val (jusqu'au PRI7)	1080	AC	200
rue Gérard de Nerval - du 1 au 16	219	F	200
rue Gérard de Nerval - du 3 au 34	226	AC	200

LINEAIRE TOTAL 3501ml de gravitaire dont 112ml de refoulement

II – TRAVAUX REALISES DURANT L’ANNEE 2019

- a) **Programme de curage et d’inspection télévisée des collecteurs eaux usées, y compris branchements particuliers**

	Curage préventif	ITV	Curage Bts	ITV Bts
Rue des Vignes	438			
Allée de la Fontaine du Curé	167.75	167.75		
Impasse du Verger	98.9	98.9		
	705 m	266 m		

- b) **Interventions d’urgence : 0 unité**

c) **Entretien des postes de refoulement PRI7 et PRC8**

Poste de refoulement intercommunal PRI7 rue du Val :

Passage une fois par semaine pour vérifier et inspecter le fonctionnement du poste.

12 Passages dans l'année pour pomper et nettoyer la bâche du poste : Mensuellement.

Poste de refoulement tête de Vallière PRC8 :

Passage une fois par semaine pour vérifier et inspecter le fonctionnement du poste.

3 Passages dans l'année pour pomper et nettoyer la bâche du poste : Janvier, Juin et Novembre

d) **Travaux sur réseaux (petites réparations)**

n° de la demande	Date de la demande	Description des travaux	Adresse	Montant HT
19-17	13-févr.	Reprise de l'accotement devant l'emprise du poste PRI7 par mise en œuvre d'une grave ciment	Poste PRI7 Rue du Val	5 660,13 €
				5 660,13 €

e) **Divers**

h1 - Enquêtes de branchement : pas d'enquête en 2019

h2 - Conformités : 9 unités dont 2 non conforme, 1 contre visite (voir annexe 1) et 0 PFAC

h3 - Avis sur PC, certificat d'urbanisme et Déclaration préalable : 6 unités

Demande reçue le	N°	Adresse de la construction	Objet de la demande
13-mai-19	PC 060 432 19 T0001	Rue Gérard De Nerval	Construction de 24 logements
23-mai-19	PC 060 432 19 T0002	Allée de Montaby	Construction d'une maison individuelle
4-juin-19	PC 060 432 19 T0003	Allée de Montaby	Construction d'une maison individuelle
13-aout-19	PC 060 432 19 T0004	18-18bis rue Gérard De Nerval- rue Cortot	24 logements
4-oct.-19	PC 060 432 19 T 0005	Rue Gérard de Nerval	17 logements
14-nov.-19	PC 060 432 19 T0006	18 et 18 bis rue Gerard de Nerval et rue Corot	Construction de 19 logements

h4 - Assainissement Non Collectif :

1 diagnostic de l'existant, 5 contrôles de conception et 1 contrôle de réalisation en 2019

Numéro	Adresse	Nom du propriétaire	Conclusion
anc-2019-diag-18	16 Impasse de la Ramée	MAEKELBERG	Installation sans Impact
anc-2019-pro-1	Allée de Montaby	SCI B LA VENERIE	Projet conforme
anc-2019-pro-2	Allée de Montaby	SCI B LA VENERIE	Projet conforme
anc-2019-pro-4	Allée de Montaby	WETZ	Projet conforme
anc-2019-pro-5	Allée de Montaby	LEJEUNE LOPEZ	Projet conforme
anc-2019-pro-6	16 Impasse de la Ramée	MAEKELBERG	Projet conforme
anc-2019-exec-1	16 Impasse de la Ramée	MAEKELBERG	Installation conforme

h5- Rétrocession et Astreinte :

Le **Sicteub** souhaiterait obtenir de la part de votre commune la liste des voiries privées rétrocédées dans le domaine communal afin de mettre à jour les plans des réseaux de votre commune et de ne pas oublier des collecteurs à entretenir.

Permanence, astreinte

Surveillance 7j/7j et 24h/24h pour dysfonctionnement sur le réseau de collecte des eaux usées.

*Pendant les heures ouvrées : **01 34 09 8 550***

*En dehors des heures ouvrées : **09 77 401 119***

III – BILAN FINANCIER 2019

** Les coûts mentionnés sur ce rapport, sont des coûts hors taxe et non actualisés.*



	Quantité réalisée	Prix Unitaire	TOTAL
Curage des collecteurs d'eaux usées :	705,00	2,18	1 536,90
Curage des branchements particuliers :	0,00	14,00	0,00
Inspection télévisée des collecteurs d'eaux usées :	266,00	2,60	691,60
Inspection télévisée des branchements particuliers :	0,00	25,00	0,00
Intervention d'urgence :	0,00	200,00	0,00
Démontage et entretien des clapets anti retour :	0,00	132,60	0,00
SOUS TOTAL :			2 228,50 €
Curage et pompage du poste de refoulement PRC8	3,00	420,00	1 260,00
Entretien et maintenance du poste de refoulement PRC8 (forfait)	1,00	4 502,43	4 502,43
SOUS TOTAL :			5 762,43 €
Enquête de branchement	0,00	50,39	0,00
Visites de conformité	9,00	103,33	929,97
SOUS TOTAL :			929,97 €
Travaux divers, petites réparations			
SOUS TOTAL :			5 660,13 €
Cout Hors-Taxes des travaux d'entretien pour la commune de Mortefontaine :			14 581,03 €

Annexe 1


TABLEAU DES CONTROLES DE SEPARATIVITE EU / EP 2019

	Rue		Gratuit	N° Dossier initial	
19-53	4 Rue Gérard de Nerval	17-janv			
19-54	4 et 6 Rue Gérard de Nerval	17-janv			
19-199	24 Rue Gerard de Nerval (appt 7)	06-mars			
19-265	18 Rue Gerard de Nerval	26-mars			Piscine EU
19-444	4 Avenue du Nautonnier	14-mai			
19-861	14 Rue Gerard de Nerval	28-août			
19-877	14 Rue Gérard de Nerval (appartement 1er étage droite)	03-sept			
19-896	14 Rue Gerard de Nerval (appartement n°2)	09-sept	CV	19-861	
19-1086	24 rue Corot	30-oct			

Annexe 2

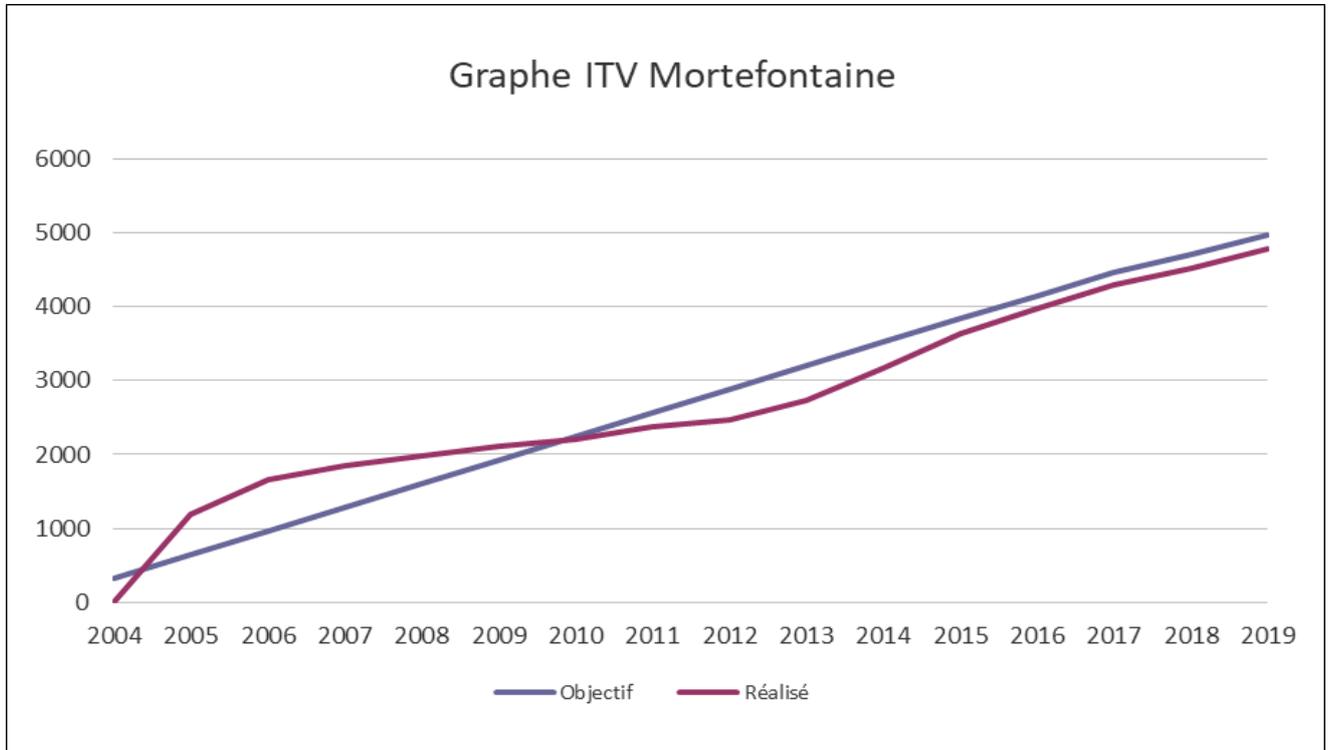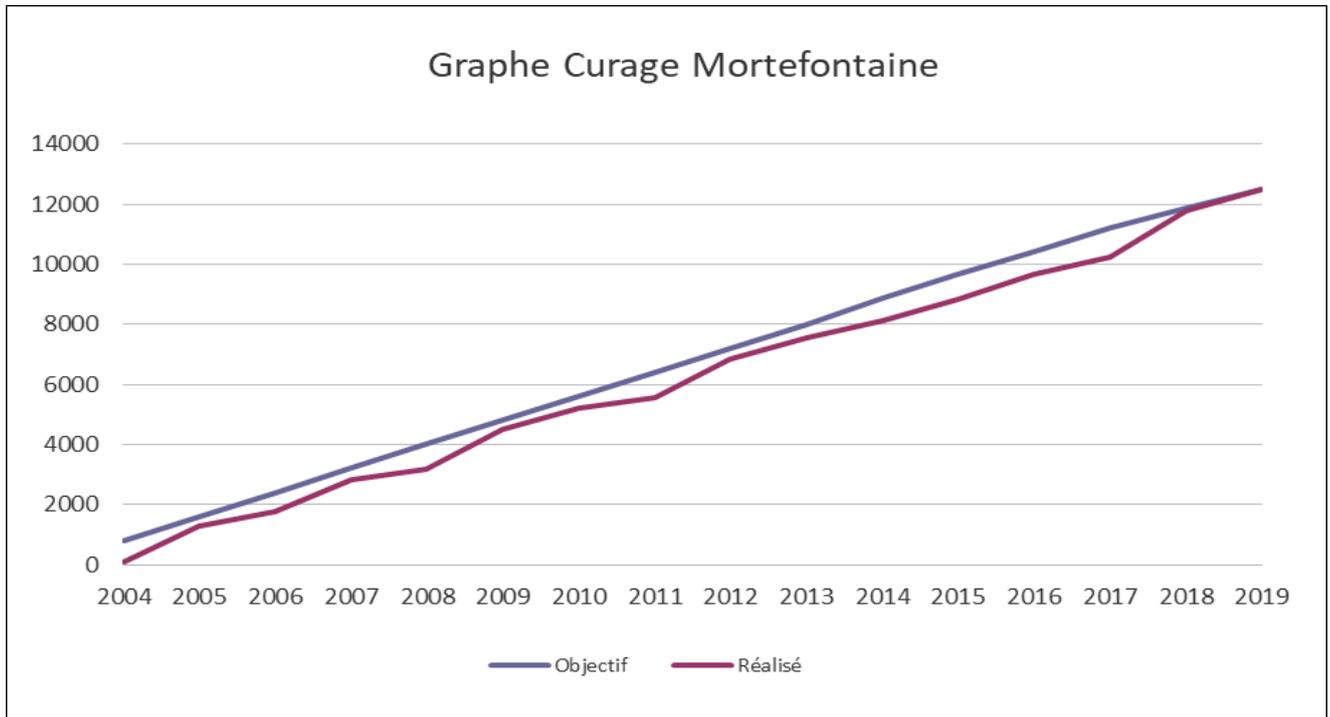

Graphe Inter d'urgence Mortefontaine

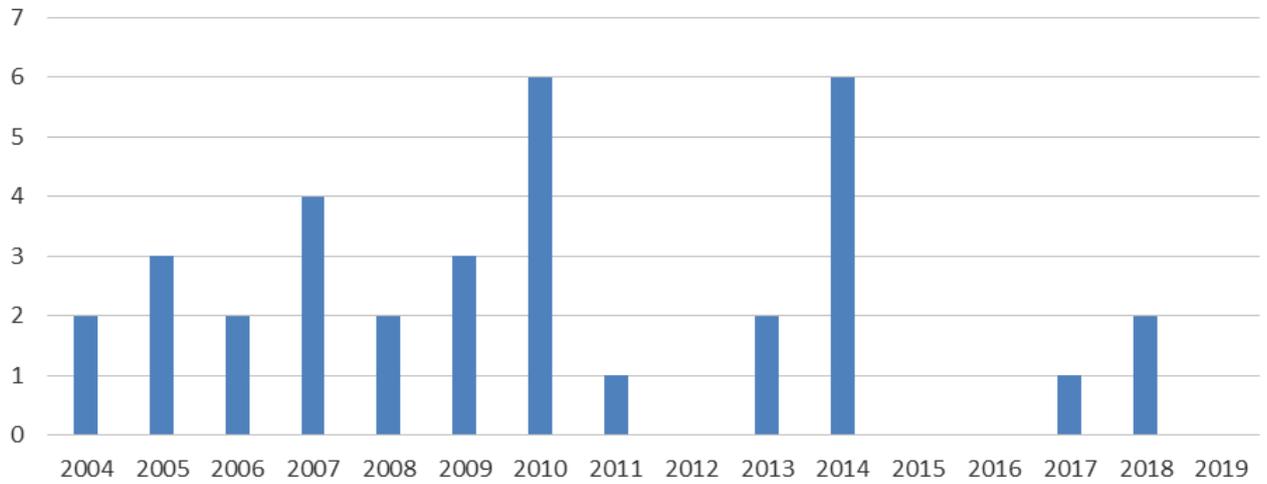

Coût des travaux d'entretien

